

1. <공약 실천계획>

관리번호 **5-③**

공보공약명	섬진강 하류권 통합개발지구 조성															
실행공약명	금오산 케이블카 설치															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○		○				○		○				○			80%
주관부서	문화관광실				담당자				박 밀			전화번호		880-2374		

■ 목 표

- 수려한 자연경관을 활용한 케이블카 설치로 대규모 관광객 유치

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년
- 사업량 : 케이블카 L=2.5Km
- 사업비 : 38,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	38,000	0	0	0	100	10,000	27,900	0
국비	0							
도비	0							
군비	0							
민자	38,000				100	10,000	27,900	

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	사업계획 구상 및 사업유치	달성 ('15. 7월 완료)
2016년	민자투자자 협약체결	달성 ('16. 2월 협약체결)
	군관리계획(궤도) 입안	달성 ('16. 6월 입안신청)
	전략환경영향평가 초안 협의	달성 ('16. 9월 초안협의 완료)
2017년	전략환경영향평가 본안 협의	달성 ('17. 1월 본안협의 완료)
	실시계획 인가 및 허가	달성 ('17. 5월 실시계획 인가 완료)
2018년	사업완료 및 운영	

2. < 공약 이행현황 >


■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 80%)

- '15. 7. : 민자투자 의향서 제출(유치)
- '16. 2. : MOU 체결 (경남도 ↔ 하동군 ↔ HDD)
- '16. 6. : 군관리계획(궤도) 입안 신청
- '16. 9. : 전략환경영향평가 초안 협의
- '17. 1. : 전략환경영향평가 본안 협의 및 군계획위원회 심의
- '17. 5. : 실시계획인가
- '17. 7. : 환경영향평가 초안 협의
- '17. 11월 현재 : 전체공정률 80 %

■ 관련 사진 및 자료



경남도, 하동군, (주)HDD MOU체결

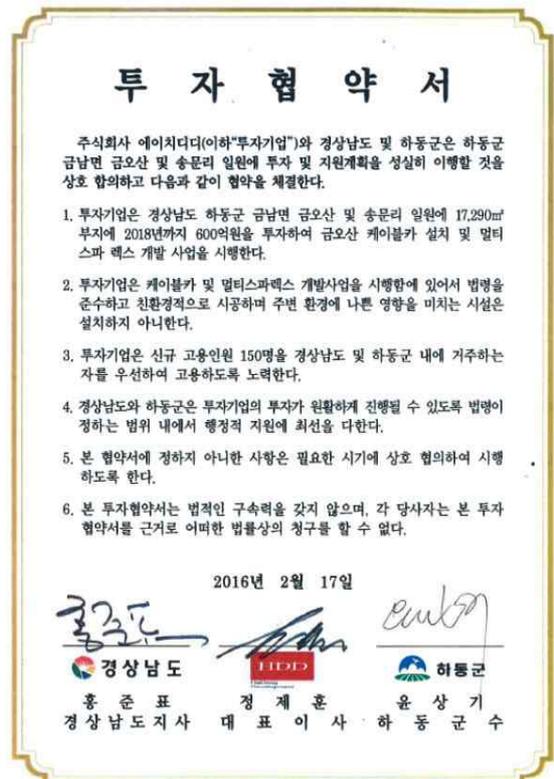

투자협약서

새로운 하동, 더 큰 하동!



하 동 군



수신 수신자 참조
(경유)

제목 하동군관리계획 결정사항 통보[하동군관리계획(궤도시설 : 금오산 케이블카 결정(변경))]

1. 문화관광실-14104호(2016.6.16.)와 관련입니다.

2. 우리군 금남면 중평리 일원 금오산 레포츠단지와 연계하여 대표 관광레저시설 구축을 위하여 "하동군관리계획(궤도시설 : 금오산 케이블카) 결정(변경)"에 대하여 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조 및 같은법 시행령 제25조의 규정에 의거 결정하고 같은법 제32조 및 시행령 제27조, 『토지이용기본규제법』 제8조의 규정에 따라 지형도면 승인고시 하였음을 알려드리며, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 또한, 시행자 **【(주)에이치디디】** 는 사업시행시 아래의 권고사항에 대하여 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

□ 권고사항

구분	권고사항	비고
하동군관리계획 (궤도시설 : 금오산 케이블카) 결정	<ul style="list-style-type: none"> 상부정류장 인근 체류시설 설치 주차장 추가확보 	

※ 고시사항은 경상남도 공보, 우리군 홈페이지 등에서 확인할 수 있음

붙임 : 고시문 1부. 끝.

하 동 군



수신자 (주)에이치디디 대표 귀하, 문화관광실장

주무관	이태훈	도시계획담당	주사	정현표	도시건축과장	전길	2017. 1. 26.
협조자					직무대리	이종열	

시행 도시건축과-5087 (2017. 1. 26.) 접수

우 52333 경상남도 하동군 하동을 군청로 23 / www.hadong.go.kr

전화번호 055-880-2233 팩스번호 055-880-2109 / terran1389@korea.kr / 대국민 공개

"정부 3.0, 국민과의 약속"

군관리계획 결정

향후계획

- '17. 10. : 프랑스 포마사 실시설계 중
- '17. 11. : 환경영향평가 본안 협의 완료
- '17. 12. : 사업 착공
- '18. 12. : 사업 완료
