

연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	공유재산관리계획 수립	달성 ('15.4월 수립 완료)
	타당성조사 및 기본계획 수립	달성 ('15.5월 수립 완료)
	투자사업 심사 완료	달성 ('15.11월 조건부 승인 완료)
2016년	군관리계획 결정(변경) 용역 시행	달성 ('16.1월 공정을 60% 달성)
	실시설계 용역 시행	달성 ('16.3월 공정을 80% 달성)
	토지보상 30%완료	달성 ('16.12월 보상을 35% 달성)
2017년	군관리계획 결정(변경) 용역 완료	달성 ('17.12월 현재 공정을 100%)
	실시설계 용역 완료	달성 ('17.12월 현재 공정을 100%)
	토지보상 100%완료('17년 9월까지)	달성 ('17.12월 현재 보상을 100%)
	입찰 의뢰 및 계약(조달청)	'18. 1월 개찰 및 계약
2018년	사업 착공	'18. 2월 착공 예정
	토목(사토 및 성토)공사 완료	'19. 2월 완료 예정
	축구장, 테니스장 조성 완료	'19. 6월 완료 예정
	골프연습장, 씨름장, 탁구장 조성 완료	'19. 10월 완료 예정
2019년	그라운드골프장, 풋살장, 족구장, 농구장, 게이트볼장 조성 완료	'20. 12월 완료 예정
	기타 부대시설 설치 및 종합 준공	'20. 12월 완료 예정

2. < 공약 이행현황 >

지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 95 %]



- '14. 11. ~ '15. 6. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- '15. 3. 2. : 중앙 투자사업 심사 의뢰(행정자치부 재정정책과)
- '15. 10. 6. : 군관리계획 결정(변경) 용역 시행
- '15. 11. 9. : 투자사업 심사 결과 조건부 승인
- '16. 2. 12. : 군관리계획 결정(변경)에 따른 제영향평가 용역 시행
- '16. 3. 23. : 실시설계 용역 시행
- '16. 7. 11. : 군관리계획 결정변경(안) 공람공고
- '16. 10. 19. : 토지보상계획 공고
('17년 2월 현재 47필지 중 15필지 보상 완료)
- '16. 11. 23. : 하동군계획위원회 개최
- '17. 1. 18. : 군관리계획 결정을 위한 경남도 도시계획과 사전협의 협의

- 2017. 2. 9. : 실시설계 용역 중간 보고회
- 2017. 3. 31. : 하동군관리계획(용도지역) 결정(변경) 신청-경남도 도시계획과
- 2017. 4. 7. : 하동군관리계획(적량체육시설) 변경결정을 위한 관련부서협의
 - 전략환경영향평가 본안 → 영산강유역환경청
 - 농지분야 협의 → 경남도 농업정책과
 - 사전재해영향성검토 → 하동군 안전총괄과
- 2017. 5. 16. ~17. : 실시설계 적정성검토(VE) 위원회 개최
- 2017. 5. 26. : 영산강유역환경청 방문(담당자 : 콕미라 팀장)
 - 환경영향평가 조치계획 제출 전 사전 협의
- 2017. 9. 24. : 토지보상 100%협의 완료
- 2017. 6. 16. : 농림지역 해제 관련 농림부 협의 완료
- 2017. 6. 28. : 전략환경영향평가 협의 완료(영산강유역환경청)
- 2017. 8. 04. : 중앙 투자사업 심사 의뢰(17년 4회 - 행정자치부 재정정책과)
- 2017. 8. 23. : 제6회 도시계획위원회(심의안건) 스포츠파크 남측부분 용도변경(원안가결)
- 2017. 8. 24. : 지방건설기술심의 제출(하동군->경상남도)
- 2017. 9. 26. : 지방건설기술심의 조건부 승인(경상남도->하동군)
- 2017. 10. 13. : 하동군계획시설 시설결정(원안가결)
- 2017. 10. 19. : 하동 스포츠파크(적량체육시설) 실시계획인가 신청
- 2017. 11. 06. : 조달청 심의 및 계약 의뢰
- 2017. 11. 14. : 하동스포츠파크(전기공사) 계약심사 결과
- 2017. 11. 15. : 2017년 제4차 중앙투자심사 결과(조건부 승인) 완료.
- 2017. 11. 21. : 하동스포츠파크 실시계획인가(교통영향성평가 심의) 조건부 승인


향후계획

- '18. 02. : 하동 스포츠파크(적량체육시설) 실시계획인가 완료
- '18. 02. : 사업 착공
- '20. 12. : 사업 준공

관련 사진 및 자료

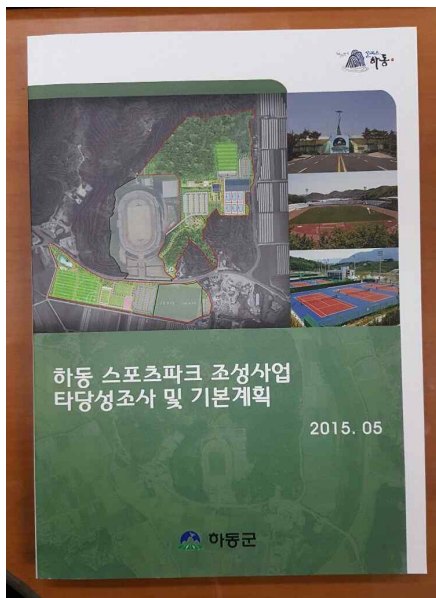

<종합계획도>

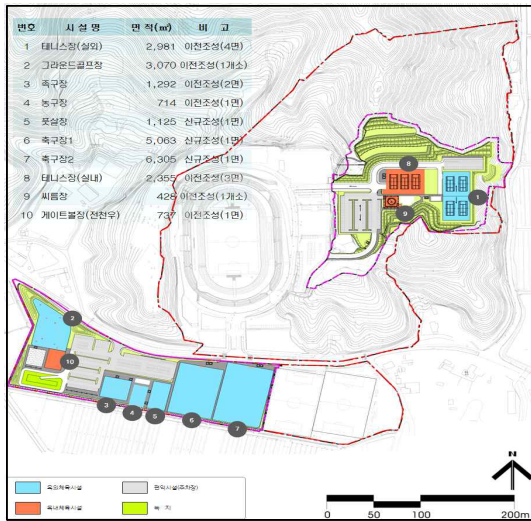

순차	담당부서(과/팀)	시설명	시행기간	시행방법	시행비(백만원)	경도관계	비고
5	경남(남해군)	수원지정수원기원단체공공체육시설	2016. 1. 2018. 12. 31	남해에서 운동장공공체육시설(8532㎡)	189(국 90, 도 90, 시 9, 민 10)	중기 지역개발계획 미 반영. 우수부수원지정공공체육시설이 없는 선결사항으로 단계로 국책지원계획 확정 후 도·군·시·자치단체의 협력을 통한 공동지원 방식으로 사업계획을 조정하여 예산정산. 타공공시설과 연계한 및 부속 건물은 '체육시설공공체육시설'로 분류하여 사업계획을 조정하여 예산정산.	제2도
6	경남(하동군)	노원·정예전 종합체육공원 건설	2015. 12. 2017. 12. 31	공공체육시설(노원) 부지면적 2355㎡, 면적부 2288(13층)	131(국 20, 도 20, 시 15, 민 19)	민간법·국선·지역개발 계획 후 도·군이 추가 지원에 맞춰 예산액 사용계획 변경하여 추진 예정	조련부
7	경남(하동군)	하동 스포츠파크 조성사업	2015. 12. 2019. 12. 31	타당면적 30,000㎡	395(국 28, 도 28, 시 15, 민 15)	중기 지역개발계획 반영. 연도별 수혜 지역계획 확정 후 군의 추가 투자에 병행하여 기존예산 범위에서 추가 예산 확보. 하동군 시설은 지원비 반영 등 확보한 예산 기준으로도 반영하여 예산정산.	조련부
8	경남(하동군)	이촌·탄현관 도로 확보공사업	2015. 12. 2018. 12. 31	도로확보공사업(0.225km, 8+4.5m)	38(국 27, 민 11)	중기 지역개발계획 반영. 경남도 도청장 승인이후에 반영하여 예산액 도의 기본계획 확정 후 군이 추가 예산 확보하여 예산정산 가능. 예산 범위에서 추진 예정	조련부
9	경남(거창군)	거창 대덕체육관 재건사업	2014. 12. 2018. 12. 31	면적부 5,700㎡	222(국 90, 도 90, 시 15, 민 27)	지원 중량 투자예산(15.5억), 재건사업 예산(15.5억) 등 사업규모 조차하여 예산정산	제2도

