

1. <공약 실천계획>

관리번호

2-④

공보공약명	해양플랜트, 신재생에너지 등 첨단기업 유치																
실행공약명	한국항공우주산업 연수원 유치																
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계					
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률	
		○	○					○	○					○			60%
주관부서	도시건축과				담당자				정현표			전화번호		880-2232			

■ 목 표

- 인근 사천지역 국가 항공산업단지와 연계한 한국항공우주산업 연수원을 유치하여 지역경제 활성화 기여

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2020년
- 사업량 : 기업연수원 1개소 A=40,881㎡
- 사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	7,000	0	0	0	300	0	700	6,000
국비	1,000							1,000
도비	300							300
군비	700				300		200	200
민자	5,000						500	4,500

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	사업계획 구상 및 부지확보	달성 ('15. 10월 부지확보 완료)
2016년	군관리계획 입안 신청 전략환경영향평가 초안 협의	달성 ('16. 10월 입안신청) 달성 ('16. 11월 초안협의 완료)
2017년	전략환경영향평가 본안 협의 군관리계획 결정, 실시계획 인가협의	달성 - '17.5월 하동군 공동위원회 자문<수정가결> - '17.10월 군관리계획 결정 경남도 사전협의(3회)
2018년	사업 착공	
2020년	사업 완료	

2. < 공약 이행현황 >

■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 60%)

- '15. 10. : 기부채납 토지 등기
- '16. 7. : 기업연수원 위한 투자자 현장확인
- '16. 10. : 군관리계획(용도지역, 지구단위계획) 입안 신청
- '16. 11. : 전략환경영향평가 초안 협의
- '17. 2. : 기업연수원 유치관련 투자자 면담
- '17. 5. : 하동군공동위원회 심의(자문) → 수정가결
- '17. 10. : 군관리계획 결정 신청을 위한 경남도 사전협의(3회)

■ 관련 사진 및 자료

연계 : 박승관 / 도시건축과 (2018-01-15 15:46:27)

발행처: 대한민국을 여는 정부3.0

영산강유역환경청

수신: 수신자 참조
(경유)
제목: 전략환경영향평가서(초안) 검토의견 회신[하동(청양 상이지구) 군관리계획 수립]

1. 하동군 도시건축과-47916(2016.10.18.)호와 관련합니다.

2. 귀 군에서 검토 요청한 "하동(청양 상이지구) 군관리계획(용도지역 및 복합형 지구단위계획) 수립" 전략환경영향평가서 초안에 대한 검토의견을 불응과 같이 회신 하오나, 본 검토의견 및 주민 등의 의견 등을 반영하여 전략환경영향평가서(본안)를 작성하시기를 바랍니다.

3. 아울러, 한국환경정책·평가연구원에서는 중 사업(사업번호 : YS20160385)의 협의의 진행현황 관리 등 환경영향평가정보지원시스템 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임: 초안 검토의견 1부, 끝.

영산강유역환경청

수신처: 하동군수(도시건축과장), 한우환경영향평가연구소

주무관	이세연	과장	박남진	국장	김영	2016. 11. 30.	이준희
-----	-----	----	-----	----	----	---------------	-----

시행: 환경평가과-5621 (2016. 11. 30.) 협수: 도시건축과-55934 (2016. 11. 30.)

부: 61945 공주광역시 서구 계수로 31. (주)중우, 영산강유역환경청 / http://yeongsan.me.go.kr

전화번호: 062-410-5257 팩스번호: 062-410-5249 / saamantha@me.go.kr / 비공개(E)

문서관리번호: 도시건축과-55934 1/1

전략환경영향평가 초안 협의

등록번호	도시건축과 -	담당자	주 사 과 장	부군수	군 수
등록일자	2017. 5.				
결재일자	2017. 5.				
공개구분	비 공개				


하동군공동위원회 개최 결과 보고

개 의 결 과


- 안 건 : 2건 → 조건부 수정가결
- 하동(용광·쌍계지구)군관리계획(복합형 지구단위계획) 변경결정
- 하동(청양 상이지구)군관리계획(용도지역 및 복합형 지구단위계획) 결정

하동 도시건축과
(도시계획담당)

하동군공동위원회 개최결과

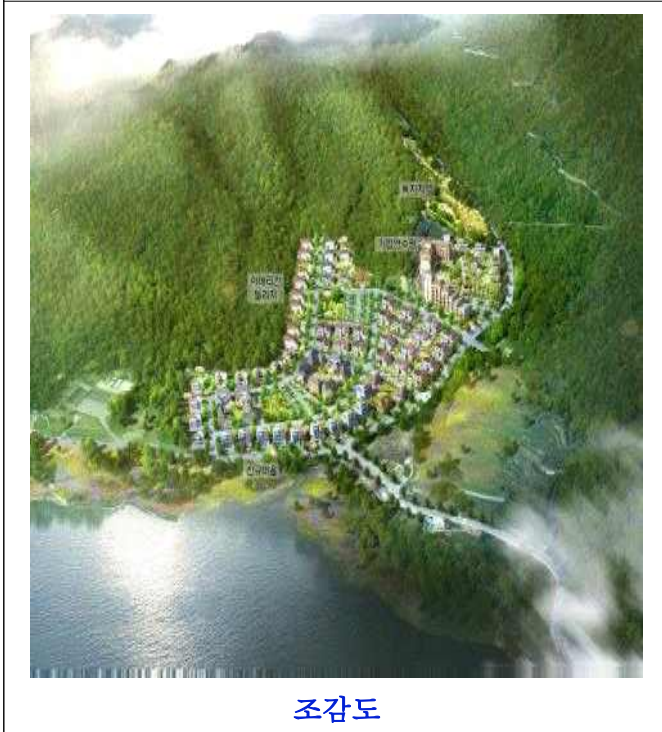

조감도

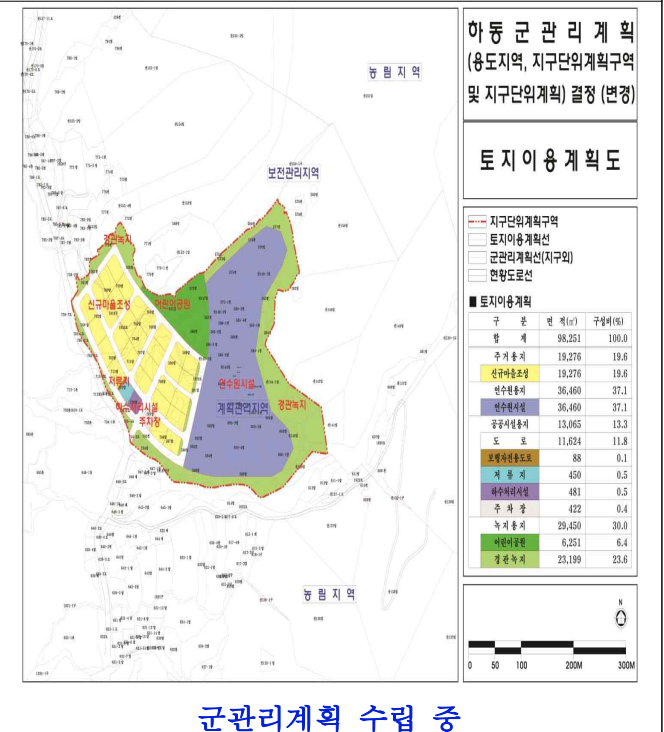

군관리계획 수립 중

향후계획

- '18. 2. : 경상남도 결정 신청
- '18. 3. : 중앙부처 및 관련부서 협의
- '18. 5. : 경상남도 도시계획위원회 심의(결정)
