

**1. <공약 실천계획>**

관리번호 **10-⑤**

<b>공보공약명</b>	<b>하동의 숲 조성 및 힐링 르네상스 프로젝트</b>															
<b>실행공약명</b>	<b>명상치유센터</b>															
<b>사업구분</b>	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○					○		100%
<b>주관부서</b>	문화관광실				담당자				박 밀			전화번호		880-2374		

**■ 목 표**

- 주민들에게 사색, 명상등 힐링공간 제공으로 삶의 질 향상 도모

**■ 사업개요**

- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년
- 사업량 : 명상치유 부지조성 A=21,950㎡, 진입로 L=397m
- 사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018	2019년 이후
계	2,000	1,360	0	640	0	0	0	0
국비	1,000	680		320				
도비	300	204		96				
군비	700	476		224				
민자	0							-

**■ 연차별 추진일정 및 목표**


구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	사업 완료 (부지조성 및 기반시설)	달성 ('15. 6월 공정율 100% 달성)
2016년 이후계속	민간 투자 유치 (건축물 및 세부 시설물 콘텐츠 구성)	추진 중

## 2. < 공약 이행현황 >

### ■ 지금까지 추진 실적 [공약 이행을 : 100%]

- '11. 4. : 지방재정 투·융자 심사 완료
- '13. 12. : 실시설계용역 완료
- '14. 1. : 사업 착공
- '15. 6. : 사업 준공
- '17. 11월 현재 : 전체공정률 100 % (명상센터 부지조성 완료)

### ■ 관련 사진 및 자료

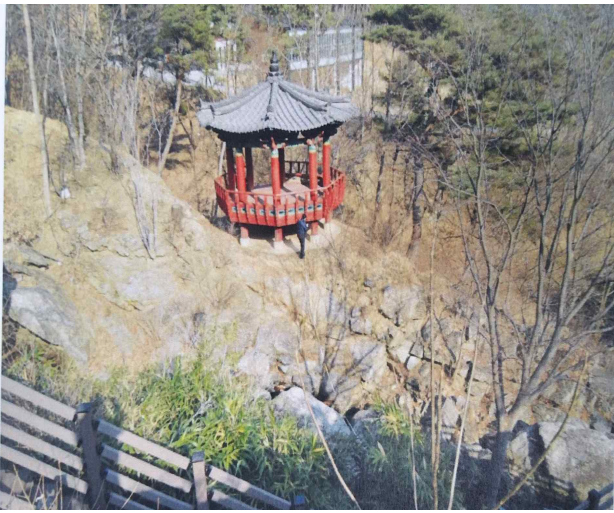

명상치유센터 부지 전경 (완료)



명상치유센터 (계획 - 민간유치)

### ■ 향후계획

- 민간투자유치 협의 중
- '17년 하반기 중 명상치유센터 건축물 건립 추진 (하동녹차 문화 연계)
