

1. <공약 실천계획>

관리번호

11-③

공보공약명	도시가스 설치 [일반주민 복지사업]															
실행공약명	하동읍 도시가스 공급															
사업구분	임기구분		사업구분		사업주체				예산구분			이행단계				
	임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	민간	예산	비예산	보류 폐기	일부 추진	정상 추진	이행후 계속 추진	완료	이행률
	○			○			○		○					○		100%
주관부서	경제수산과				담당자				이영록			전화번호		880-2208		

■ 목 표

- 청정에너지인 도시가스를 공급하여 군민가계의 연료비 부담을 해소하고 지역경제를 활성화하여 하동읍 도시개발에 기여함.

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
- 사업량 : 도시가스 800세대이상 공급
 - 도시가스 위성기지 LNG 제조시설(32톤) 설치, 공급배관공사 L = 11.6km 1식
- 사업비 : 6,457백만원 (단위 : 백만원)

구분	총액	기투자	2014	2015	2016	2017	2018년	2019년 이후
계	6,457	-	-	1,363	744	755	982	2,613
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	507	-	-	113	94	105	100	95
군비	5,950	-	-	1,250	650	650	882	2,518

■ 연차별 추진일정 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2015년	보조금 지원조례 제정 및 공사착공	달성 ('15.6월 공사 착공)
2016년	하동읍 도시가스 공급	달성 ('16.12월 도시가스 공급 개통식)
2017년	도시가스 공급망 연차적 확대	달성 ('17.12월말 기준 832세대 공급)
2018년	도시가스 공급망 보급확대	보급확대 3개지구 착공(전체16개 구간)

2. < 공약 이행현황 >

하동읍 보급확대 3개지구 착공(전체 16개 구간)



■ 지금까지 추진 실적 (공약 이행을 : 100 %)


- '15. 04. 17. : 도시가스 착공 협약(MOU) 체결
- '15. 06. 10. : 1차 단독구간 배관공사 착공
- '15. 11. 11. : 도시가스 보급확대 도비 확보(113백만원)
- '15. 12. 28. : 공급방식 전환 확정('16년 탱크저장 ⇨ '18년 배관방식)
- '16. 12. 25. : 적량면 위성기지 ~ 하동읍사무소(5km) 배관공사 완료
- '16. 12. 28. : 하동읍 도시가스 공급 개통식(공급신청세대 530세대)
- '17. 12. 31. : 832세대 공급

<확대추진>

- 2018. 1월 : 국민건강보험공단~국민임대주택 일원 도시가스공급 개시
- 2018. 2월 : 2018년 조례구간 배관공사 착공

■ 관련 사진 및 자료

<p style="text-align: center;">하동군 도시가스 공급사업 착공 협약서</p> <p>경상남도 하동군(이하 “갑”이라 한다.)과 주식회사 지에스이(이하 “을”이라 한다.)는 하동군 하동읍 내 도시가스 공급 사업을 위하여 신의성실에 입각하여 아래와 같이 협약한다.</p> <p style="text-align: center;">아 래</p> <p>1. “을”은 2015년부터 사업을 추진하여 하동군 하동읍 지구에 도시가스를 공급한다.</p> <p>2. “갑”은 적기 공급 및 보급 확대를 위해 다음 사항을 시행한다.</p> <p>가. 절차를 간소화하여 적기 공급을 할 수 있도록 인·허가, 민원해결 등 적극적 행정지원</p> <p>나. 수요자가 부담하여야 할 시설분담금 대한 재정지원</p> <p>다. “을”에 대한 시설투자비 및 운영비 보조</p> <p>3. “갑”과 “을”은 상호간 발전을 위해 적극 협력하며, 본 협약에 따른 세부 시행방안은 별도 협약에 따른다.</p>	<p>본 투자협약서는 체결과 동시에 효력이 발생하며, 협약 내용을 명확히 하기 위하여 총 2부를 작성하여 각 대표자가 서명하고 1부씩 보관한다.</p> <p>붙임 : 하동군 도시가스 공급 세부시행 협약서 1부.</p> <p style="text-align: right;">2015년 4월 17일</p> <p>“갑” 경상남도 하동군 하동읍 군청로 23 하 동 군 수 윤 상 기 </p> <p>“을” 경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30 지에스이 대표 유 석 형 </p>
--	--

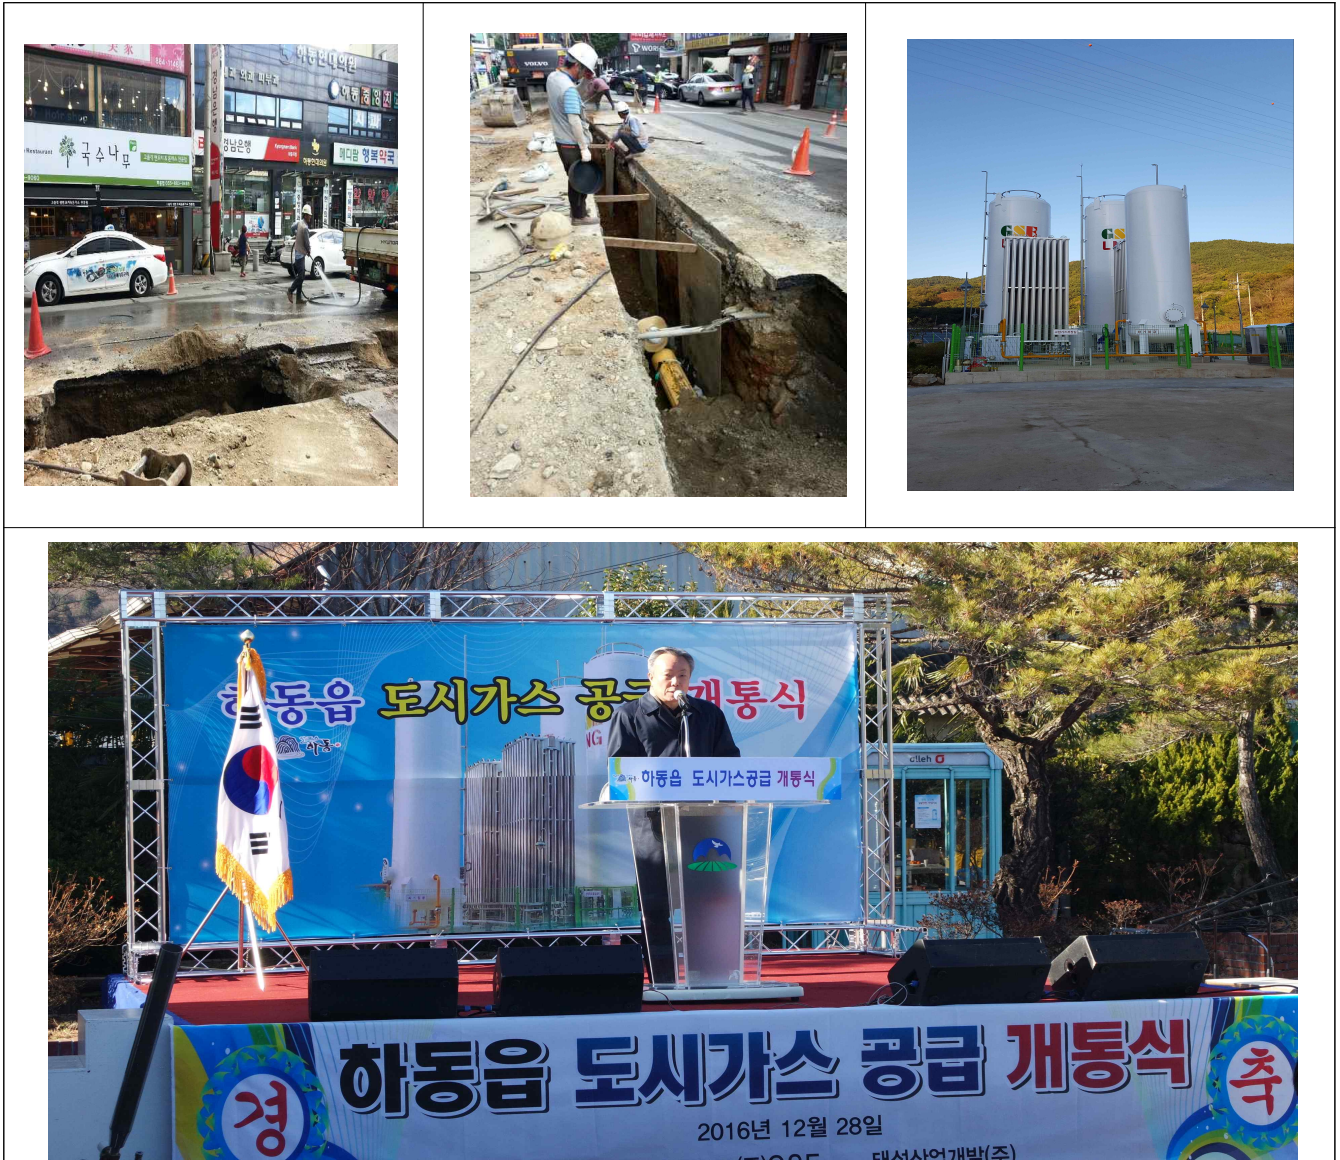

■ 향후계획 (공급 확대)

- 2018. 3월 : 적량 공급관리소 착공
 - 사업량 : 적량GS 1개소, 주배관(고압배관) 30' × L=1.2km, 2열
- 2018. 04월 : 비파삼거리~공급관리소 일원(약1.6km) G/S 중압배관공사 착공
- 2018. 12월 : 도시가스 배관방식 변경(탱크로리 ->배관공급) 준공 완료
