

III-6

청암 하동호 중심 관광 플랫폼 구축

공 약 목 표	○ 청학동, 삼성궁, 지리산둘레길 등과 연계한 하동호 관광플랫폼 구축으로 관광객 흡인력 제고와 관광활성화 추진			
추진부서	문화관광과 관광개발부서	담당자(행정전화)	임대현(2372)	최경열(2373)
완료시기	■ 임기내(2026) □ 임기후	사업구분	□ 신규사업	■ 계속사업
사업주체	□국 □도 ■군 □기타	예산구분	■ 예산	□ 비예산
이행단계	□완료 □이행후 계속추진 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기			추진율 50%

현황

- 하동호 출렁다리 조성사업 추진
- 남부권 광역 관광개발사업 기본구상 반영(하동호 산림호반 관광콜렉션)
- 하동 동북권 관광개발계획 수립 용역 추진

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용
 - 지리산 둘레길 코스와 연계한 하동호 랜드마크 출렁다리 조성
 - 하동호 수변공간, 자연자원 등을 활용한 관광 거점 구축
- 사업비

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산확보 실적				
	소계	국비	도비	군비	기타	소계	국비	도비	군비	기타
총계	9,000	0	5,850	3,150	0	3,000	0	1,950	1,050	0
~2022	1,000		650	350		3,000		1,950	1,050	
2023	0					0				
2024	6,000		3,900	2,100		0				
2025	1,000		650	350		0				
2026	1,000		650	350		0				


연차별 추진계획 및 목표

구분	주요 추진계획 및 목표	목표 달성 여부
2022	○ 하동호 출렁다리 조성사업 착수	달성
2023	○ 하동호 출렁다리 조성사업 추진	달성
2024	○ 하동호 출렁다리 조성사업 추진	
2025	○ 하동호 주변 관광 거점 구축 추진	

추진 실적

- 2022. 7. : 하동호 출렁다리 조성사업 착수
- 2022. 7. : 남부권 광역관광개발 기본구상 반영 제안서 제출
- 2022. 9. : 남부권 광역관광개발계획 수립을 위한 사업계획 제출
- 2023. 5. : 동북권 관광개발계획 수립 용역 추진
- 2023. 10. : 동북권 관광개발계획 수립 용역으로 하동호 일원 마중물사업 발굴 (하동호 암차일 조성, 수변경관 확보)
- 2023. 11. : 출렁다리 주탑 기초공사 중

사진 및 자료

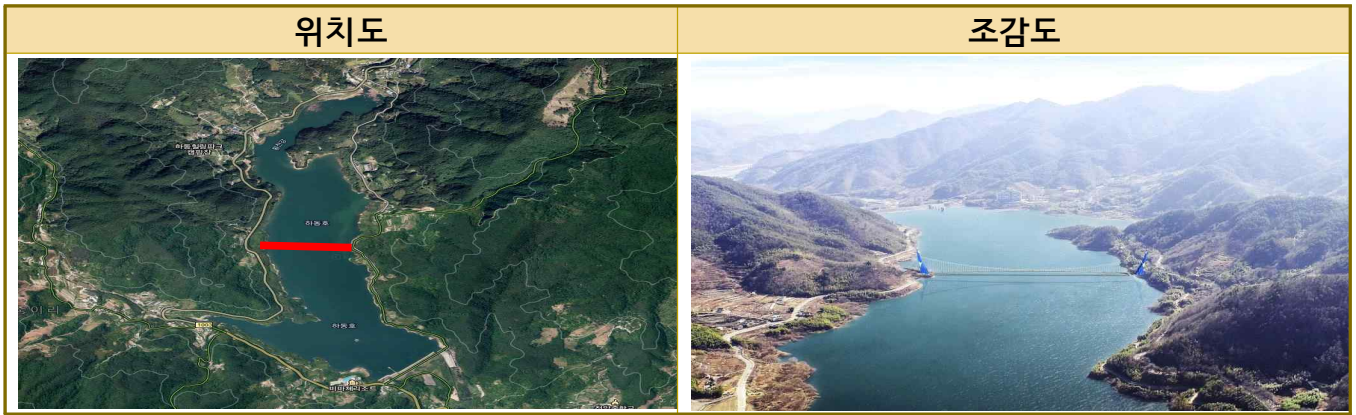

향후 계획

- 2024. 1. : 출렁다리 주탑 기초공사 완료
- 2024. 1. : 사업비 증가에 따른 사업비 확보 노력
- 2024. 2. : 동북권 관광개발 사업 추진(하동호 암차일 조성, 수변경관 확보사업)

군민소통현황

설명회,공청회	만족도조사	전문가자문	언론/방송보도	SNS홍보	기타 (오프라인)
-	-	-	-	-	-
